

(仮称) 鳩山新ごみ焼却施設建設工事

工事の進捗状況について

Vol. 46 2022年8月号



○ 2022年7月末時点の施工状況

工場棟1工区:プラント機器・配管・電気計装・耐火材工事を継続しています。
今月より保温工事を開始しています。

工場棟2工区:居室部各所仕上げ作業を継続しています。

工場棟3工区:プラットホーム天井部・床の仕上げ工事を開始しています。

管理棟エリア:居室部各所仕上げ作業を継続しています。

外構エリア:工場棟南側の外構工事を実施しています。
計量棟鉄骨工事を開始しています。

※搬入路法面については、7月12日の豪雨の影響により、崩落拡大防止の応急措置としてブルーシートを設置しています。



施設北東側より(2022年7月20日現在)

○ 施工状況写真




●1工区 炉室屋根防水施工状況



●1工区 灯油配管耐圧試験実施状況




●1工区 ボイラ配管保温施工状況

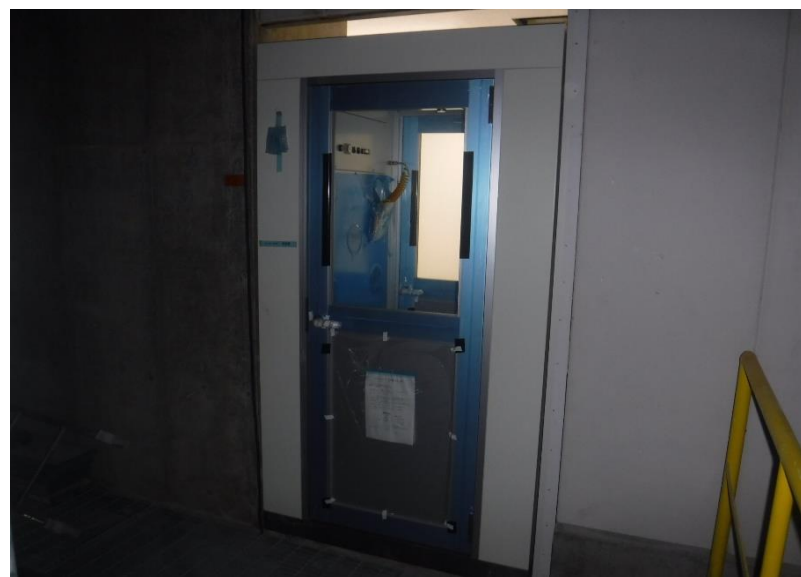

●1工区 炉室出入口エアシャワー設置状況

○ 施工状況写真

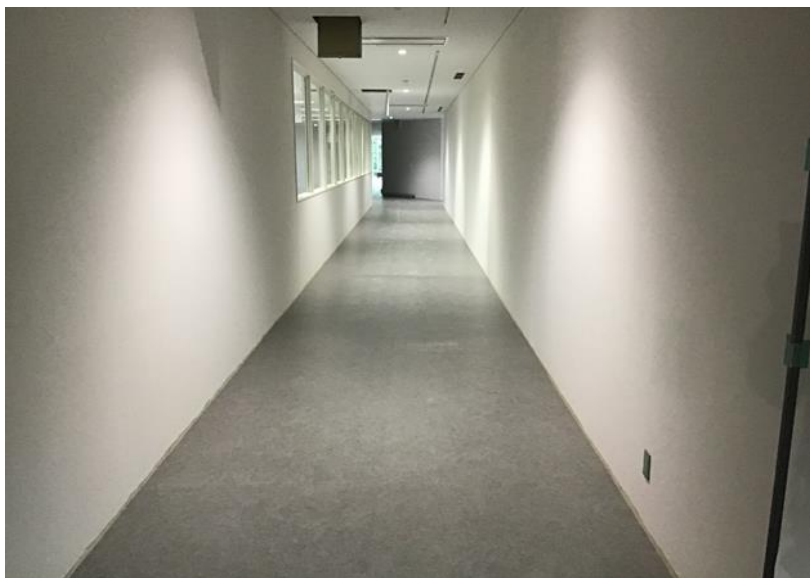

●2工区 2階見学者通路仕上げ状況



●2工区 ごみクレーン操作盤設置状況



●管理棟 外部トイレ壁タイル貼状況



●計量棟 鉄骨建方状況
